

IV. 포용의 도시 - ② 육아친화도시

3 권역별 장난감도서관 확충

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
1,797백만원	신규	임기내	송파구	이행 후 계속추진

1. 사업목표

- 임기내 목표: 권역별 하하호호 장난감도서관 추가 설치
 - 현재 2개소 ⇒ 2개소 추가하여 총 4개소로 확대
- 연차별 추진계획

세부추진계획	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
공간발굴	공 간 발 굴				
권역별 확충계획수립	권역별 확충 종합계획수립		-		
[1권역] 잠실권역 설치추진	-	예산확보 및 설치공사	개관 및 운영활성화		
[2권역] 문정권역 설치추진		대상지 선정	예산확보	설치공사 및 개관	운영활성화
[추가계획] 풍납권역 설치추진		-	대상지발굴 및 공사	개관 및 운영활성화	

2. 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 주요내용
 - 사업개요
 - 위 치 : 송파구 전역
 - 내 용 : 권역별 「하하호호 장난감도서관」 추가 설치
 - 사업비 : 총1,797백만원 (※설치비 외부재원 확보 필요)
 - 추진계획
 - 잠실점 설치 후 권역별 확충 지속 추진
 - 신규 개소점 운영활성화

3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'22 3분기	9.29.	◦ 풍납권역 거점시설 활용신청	
	10.3.	◦ 잠실권역 설치장소확정	
'22. 4분기	10.17.	◦ 잠실권역 특별교부금 신청	
	12.22.	◦ 잠실권역 예산확보 및 명시이월	500
'23. 1분기	2.27.	◦ 잠실권역 실시설계 일상감사	
	3.10.	◦ 잠실권역 실시설계 착수	23
	5.1.	◦ 풍납권역 거점시설 현장점검(협의부서: 문화재과)	
	5.31.	◦ 잠실권역 실시설계 준공	
'23. 2분기	6.16.	◦ 공사 전 사전 논의(협의부서: 공원녹지과, 건축과)	
'23. 3분기	8.18.	◦ 잠실권역 건축공사 입찰 공고	
	9.4.	◦ 잠실권역 건축공사 낙찰자 선정	
	9.18.	◦ 잠실권역 건축공사 입찰계약	181
'23. 4분기	10.20.	◦ 잠실권역 전기공사 수의계약	53
	11.13.	◦ 잠실권역 소방공사 수의계약	7
	11.27.	◦ 잠실권역 통신공사 수의계약	15
'24. 1분기	3.12.	◦ 잠실권역 통신·소방 공사 준공	22
	3.29.	◦ 잠실권역 건축 전기 공사 준공	234
	5.30.	◦ 잠실권역 하하호호 장난감도서관 개관	
'24. 2분기	4. ~ 7.	◦ 문정동 하하호호 장난감도서관 설계용역 시행	

4. 문제점 및 대책(현안사항)

- 단계별·장기적 사업 추진을 위한 구비 편성

5. 주민소통 실적

- 해당없음

6. 향후 추진계획

기간	추진내용
2024년	1 분기 ◦ 잠실권역 공사 준공 및 물품 및 기자재 구입
	2 분기 ◦ 잠실권역 개관 및 운영
	3 분기 ◦ 문정권역 실시설계용역 시행 및 입찰계약

7. 집행예산 현황

(2/4분기 기준, 백만원)

구분	연도	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
		합계 (단위:백만원)	소요 -	500	598	-	-
국비	소요	-	-	-	-	-	
	집행	-	-	-	-	-	
시비	소요	-	500	478	-	-	
	집행	-	22	386	-	-	
구비	소요	-	-	120	-	-	
	집행	-	-	19	-	-	
기타	소요	-	-	-	-	-	
	집행	-	-	-	-	-	

※ 명시이월액 포함: 23년도 집행잔액 478백만원

8. 위치도 및 현황사진

○ 위치도



[기존조성지]

오금 위례 지역: 2개소

[신규조성지]

· 기존목표

잠실 권역 1개소 **확충**


· 추가계획

문정·풍납 권역 2개소 **확충**

○ 현장사진



【 잠실점 】

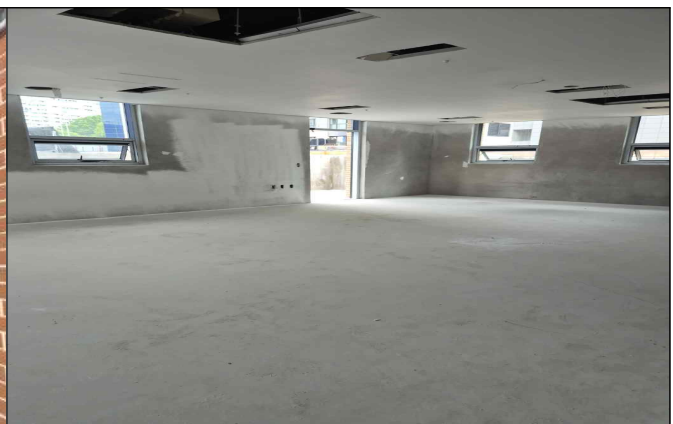

【 문정점 】

여성보육과	과장 이명아	보육지원팀장 조화영	담당 임현진 (☎ 2793)
-------	--------	------------	-----------------
