

II. 풍요로운 도시 - ② 녹색자연도시

1 오금공원 시설 환경개선 추진

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
3,921백만원	신규	임기내	송파구	정상추진

1. 사업목표

- 임기내 목표: 오금공원 시설 환경개선사업 8건 시행
- 연차별 추진계획

단위사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
안내체계 개선	◦ 추진완료				
화장실 신규설치 및 보수		◦ 신규설치(완료)			◦ 보수정비 실시
노후시설물 정비 (놀이터, 운동시설 등)		◦ 인공폭포 정비 ◦ 운동공간 조성 (완료) ◦ 논슬립 설치 및 노후계단정비 (완료)	◦ 인공폭포 정비 (이월 공사 중) ◦ 놀이터 정비		
산책로 정비		◦ 무장애숲길 조성	◦ 무장애숲길 조성 (이월, 완료)		
청소년 모험공간조성 (실내서바이벌 스포츠장 조성)	-	◦ 특교세 교부 사업계획 수립	◦ 기본(실시)설계 착공 & 준공 개소식	◦ 운영 및 관리	◦ 운영 및 관리
청소년 모험공간조성 (서바이벌스포츠 대회 개최)	-	◦ 1회 개최(10월)	◦ 대회 : 1회 ◦ 실내 서바이벌 스포츠장에서 정기 행사	◦ 대회 : 1회 ◦ 실내 서바이벌 스포츠장에서 정기 행사	◦ 대회 : 1회 ◦ 실내 서바이벌 스포츠장에서 정기 행사

2. 사업개요

▪ 오금공원 화장실 신규설치(완료)

- 기 간: 2023. 2. ~ 10.
- 주요내용: 화장실 신규설치 1개소, 화장실 진입시설 설치 등
- 소요예산: 총 190백만원 (시비)
- 추진계획
 - 2023. 2. : 추진계획 수립
 - 2023. 2. ~ 5. : 실시설계 및 서울시 심의 등 행정절차 이행
 - 2023. 6. : 공사발주
 - 2023. 7. ~ 10. : 공사시행 및 준공

▪ 오금공원 화장실 보수정비

- 기 간: 2026. 1. ~ 12.
- 대 상: 화장실 3개소
- 주요내용: 화장실 및 주변 휴게공간 정비 등
- 소요예산: 총 200백만원 (시비)
- 추진계획
 - 2025. 6. : 예산 요청
 - 2026. 1. : 추진계획 수립
 - 2026. 2. ~ 4. : 실시설계, 설계심의 등 행정절차 이행
 - 2026. 5. ~ 12. : 공사시행 및 준공

▪ 오금공원 인공폭포 정비(추진 중)

- 기 간: 2023. 2. ~ 2024. 6.
- 주요내용: 상하부 수조 교체, 인조암 보수정비, 펌프교체 등
- 소요예산: 총 1,425백만원 (시비)
- 추진계획
 - 2023. 2. : 추진계획 수립
 - 2023. 3. ~ 10. : 실시설계, 설계심의 등 행정절차 이행
 - 2023. 11. : 계약심사, 공사발주
 - 2023. 12. ~ 2024. 6. : 공사시행 및 준공

▪ **운동시설 주변 정비(완료)**

- 기 간: 2023. 2. ~ 9. ※ 안내체계 개선 완료('22년 하반기, 36백만원)
- 주요내용: 운동시설 설치, 논슬립 및 핸드레일 설치 등
- 소요예산: 총 145백만원 (시비 95 구비 50)
- 추진계획
 - 2023. 2. : 추진계획 수립
 - 2023. 3. ~ 6. : 자체설계 및 행정절차 이행
 - 2023. 7. ~ 9. : 사업시행 및 준공

▪ **오금공원 무장애숲길 조성사업(완료)**

- 기 간: 2023. 2. ~ 2024. 6.
- 주요내용: 무장애데크 및 쉼터 조성, 수목식재 등
- 소요예산: 총 1,425백만원 (시비)
- 추진계획
 - 2023. 2. : 추진계획 수립
 - 2023. 2. ~ 11. : 실시설계, 건설기술심의, 공사발주 등 행정절차 이행
 - 2023. 12. ~ 2024. 6. : 공사시행 및 준공

▪ **오금공원 놀이터 정비(추진 중)**

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 주요내용: 노후된 어린이놀이시설물 및 바닥포장 교체 등
- 소요예산: 총 300백만원 (시비)
- 추진계획
 - 2024. 1. : 추진계획 수립
 - 2024. 2. ~ 4. : 실시설계, 설계심의 등 행정절차 이행
 - 2024. 5. ~ 12. : 공사시행 및 준공

▪ **청소년 모험공간 조성(추진 중)**

- 기 간 : (공간조성) 24.10월 (행사) 24.10월(대회), 소규모 정기행사
- 주요내용
 - 실내 서바이벌 스포츠장 조성
 - 위치 및 규모 : 송파구 중대로4길4, 1층 (65㎡)

- 기 간 : 2024. 5. ~ 2024. 10.
- 내 용 : 실내 서바이벌 스포츠장 조성
- 사업비 : 200백만원(구비) ※특별교부세 및 구비 확보('23.12월)
 ※ 청소년전용공간 조성: 700백만원 확보(구 400-'24년도 예산, 특교세 300)
- 서바이벌 스포츠 대회(행사) 실시
 - 위치 및 규모 : 서울놀이마당 또는 송파청소년센터 (1회 250명 이내)
 - 기 간 : (대회)연중 1회, (이벤트) 다수(서바이벌 스포츠 전용공간)
 - 내 용 : 서바이벌 스포츠 '레이저태그 배틀' 경기
 - 사업비 : 20백만원(구비)

3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'22. 4분기	'22.11.	◦안내체계 개선 추진(완료) (공원 안내판 설치 7개소, 노면표시 37개소 완료)	36
'23. 1분기	'23.1~3.	◦오금공원 시설 환경개선(공약사업) 관련 추진계획 수립 및 실시설계용역 시행 ※ 청소년 모험공간 조성(서바이벌 체험장) - 송파정책자문위원회 도시환경분과 회의 실시	-
	'23. 3. 6.	◦ 1/4분기 송파정책자문위원회 정기회의 안건 상정	-
'23. 2분기	'23. 4.~6.	◦오금공원 시설 환경개선(공약사업) 관련 추진 - 실시설계, 설계심의, 업무협의를 등 행정절차 이행 등	10
	'23. 7.28.	◦ 오금근린공원 시설 설치 불가로 주관부서 변경	
	'23. 8.28.	◦ 서바이벌 스포츠 추진 관련 청장님 보고	
'23. 3분기		◦화장실 신규설치 - 공사 착공	-
	'23.7.~9.	◦운동시설 주변 정비(완료) - 운동공간 조성, 논슬립 설치 등	145
		◦인공폭포 정비 - 유관기관 업무협의를, 설계심의 등	50
		◦무장애숲길 조성 - 주민설명회 개최 등	50
	'23.10.14.	◦ 송파 유스 서바이벌 스포츠 행사 실시	10
	'23. 11.	◦ '24년도 예산에 청소년전용공간 예산 400 반영	-
	'23.12.11.	◦ 청소년전용공간 조성 목적으로 특교세 확보(300)	-

'23. 4분기	'23.10.~12.	◦ 화장실 신규설치 - 공사 준공	180
		◦ 인공폭포 정비 - 계약심사, 공사발주 등(사고이월)	-
		◦ 무장애숲길 조성 - 건설기술심의, 공사발주 등(사고이월)	-
'24. 1분기	'24.1.~3.	◦ 오금공원 놀이터 정비 - 추진계획 수립, 실시설계용역 시행	15
'24. 2분기	'24.4.~6.	◦ 오금공원 놀이터 정비 - 어린이놀이시설물 선호도 조사, 市 설계심의 ◦ 무장애숲길 조성(완료) ◦ 인공폭포 공사(진행 중)	1,171
	'24. 6.	◦ 실내 서바이벌 스포츠장 조성 - 舊 유아예체능단 장소 철거 - 실시설계 중	45

4. 문제점 및 대책(현안사항)

○ 별도 없음

5. 주민소통 실적

구 분	일 자	주 요 내 용
설명회·토론회	2023.8.29.	◦ 현장간담회 개최(오금공원 화장실 조성)
	2023.9.18.	◦ 주민설명회 개최(오금공원 무장애숲길 조성)
민간전문가 자문	2023.3.6.	◦ 1/4분기 송파정책자문위원회 정기회의
	2023.8.~	◦ 송파청소년센터와 행사 추진 관련 실무진 회의 지속 진행중
언론보도	2023.10.14.	◦ 송파유스 서바이벌 스포츠 참가자 모집 보도자료 제출

6. 향후 추진계획

기 간		추진내용
2024년	3 분기	◦공시준공('25년 예산 신청) (놀이터 정비)
		◦실시설계 및 착공 (실내 서바이벌 스포츠장 조성)
2024년	4 분기	◦공시준공(놀이터 정비)
		◦준공 및 개소식 (실내 서바이벌 스포츠장 조성)

7. 집행예산 현황

(2/4분기 기준, 단위: 백만원)

구 분	연 도	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
		합 계 (단위:백만원)	소요	36	3,195	3,270	-
	집행	36	445	1,231	-	-	-
국 비	소요				-	-	-
	집행				-	-	-
시 비	소요	36	3,135 (이월 2,750)	3,050 (이월 포함)	-	-	-
	집행	36	385	1,186	-	-	-
구 비	소요		60	220	-	-	-
	집행		60	45	-	-	-
기 타	소요				-	-	-
	집행				-	-	-

8. 위치도 및 현황사진

○ 위치도



○ 현장사진



화장실 조성



논슬립 설치




운동공간 조성



무장애숲길 조성

○ 위 치 도(실내 서바이벌 스포츠장)

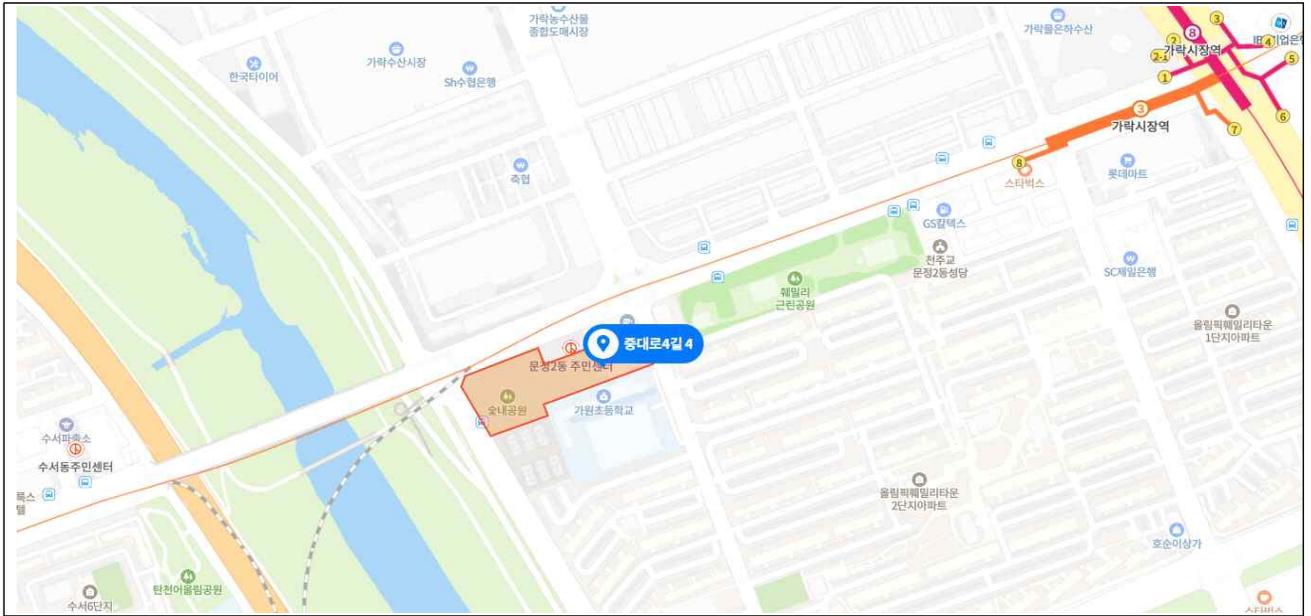

○ 현장사진(실내 서바이벌 스포츠장)



2023. 송파유스 서바이벌 대회 기념촬영



2023. 송파유스 서바이벌 대회 행사장



실내 서바이벌 스포츠장 조성 공간
(유아예체능단 철거 완료)



실내 서바이벌 스포츠장 조성 예시

공원녹지과	과장 주동희	공원1팀장 신정림	담당 정재일(☎ 3393)
-------	--------	-----------	----------------
