

## II. 풍요로운 도시 - ② 자연녹지도시

# 5 아름어린이공원(옛 삼전도비 부지) 문화·복지공간 확충

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
570백만원	신규	임기내	송파구	추진완료

### 1. 사업목표

- 임기내 목표: 아름어린이공원 문화·복지공간 조성
- 연차별 추진계획

단위사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
실시설계	8월 완수				
공 사	10월 착공	2월 준공			

### 2. 사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2023. 2. 28.
- 위 치 : 아름어린이공원(석촌동 289-3)
- 규 모 : 2,339 $m^2$
- 사 업 비 : 총 570백만원(구비)
- 사업내용 : 송파구만의 특색있는 문화·복지공원 조성으로 쾌적하고 안전한 환경 제공, 놀이·휴게시설물 및 바닥포장 교체

### 3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'22 3분기	2022. 8. 31.	◦ 실시설계 용역 완수	570
'22. 4분기	2022. 10. 17.	◦ 공사 착공	
'23. 1분기	2023. 2. 28.	◦ 공사 준공	

### 4. 주민소통 실적

구분	일자	주요내용
간담회	2022. 5. 18.	◦ 어린이 협의체 간담회 개최
설명회	2022. 7. 20.	◦ 주민설명회 개최


## 5. 집행예산 현황

(단위 : 백만원)

연 도		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
구 분	소요	570	-	-	-	-	-
	집행	566	-	-	-	-	-
구 비	소요	570	-	-	-	-	-
	집행	566	-	-	-	-	-

## 6. 위치도 및 현황사진

○ 위치도

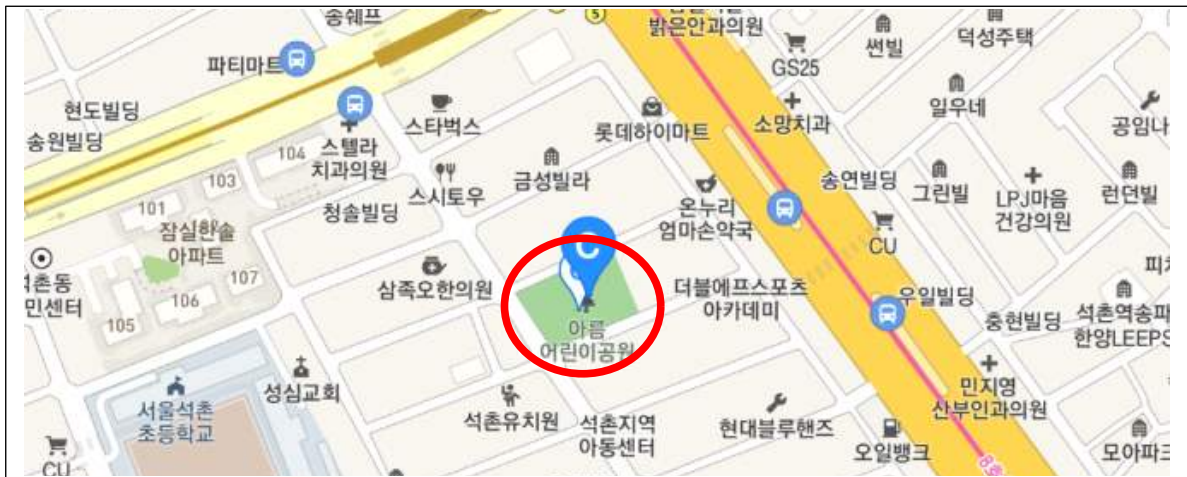

○ 현장사진



공사 전

공사 후

공원녹지과	과장 정상범	공원2팀장 김소연	담당 이경린 (☎ 3387)
-------	--------	-----------	-----------------
