

II. 풍요로운 도시 - ② 자연녹지도시

6 어린이공원 등 소공원 시설정비

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
14,300백만원	신규	임기내	송파구	정상추진

1. 사업목표

- 임기내 목표: 구민이 안전하게 인근 공원을 이용할 수 있도록 관내의 노후 어린이공원 등 39개소 정비 추진
- 연차별 추진계획

단위사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
정비계획 수립	9월 완료				
노후 어린이공원 39개소 정비	9개소 정비완료	9개소 정비완료	6개소 정비예정	8개소 정비예정	7개소 정비예정

2. 사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.(5개년)
- 위 치 : 중대어린이공원 등 39개소
- 규 모 : 65,455㎡
- 사 업 비 : 총 14,300백만원 (국 160, 시 4,330, 구비 9,300, 기타 510)
- 사업내용 : 노후 어린이공원 시설 교체 및 환경 개선

3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'22. 3분기	2022. 9. 28.	◦ 5개년 정비계획 수립	3,000
'22. 4분기	2022. 12. 31.	◦ 22년 정비사업 완료(9개소)	
'23. 1분기	2023. 1.~3.	◦ 23년 실시설계용역 시행(7개소)	3,213
'23. 2분기	2023. 4.~6.	◦ 공사완료: 2개소(천상, 가야금) ◦ 특교금 교부(500백만원, 1개소)	
'23. 3분기	2023. 7~9.	◦ 설계 용역 시행: 1개소(부림)	
'23. 4분기	2023. 10~12.	◦ 공사완료: 7개소(삼학사, 꿈나무 등)	1,360
'24. 1분기	2024. 1.~3.	◦ 24년 실시설계용역 시행(6개소)	
'24. 2분기	2024. 4.~6.	◦ 24년 실시설계용역 완료(5개소), 공사발주	

4. 문제점 및 대책(현안사항)

- 사업 추진을 위한 국·시비 확보 필요 및 예산 확보 노력

5. 주민소통 실적

구 분	일 자	주 요 내 용
설명회	2022.~2023	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 연도별 사업관련 주민설명회 개최(5회) - '22.03.05. / '23.02.20 / '23.04.12. / '23.04.13. / '23.08.30.

6. 향후 추진계획

기 간		추 진 내 용
2024년	3 분기	◦공사 착공 및 공사 완료(5개소)
2024년	4 분기	◦공사 착공 및 공사 완료(1개소)


7. 집행예산 현황

(2/4분기 기준, 단위: 백만원)

구 분	연 도	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
	합 계 (단위:백만원)	소요	3,000	3,213	1,360	-	-
	집행	2,897	2,606		-	-	-
국 비	소요	160		100	-	-	-
	집행	128			-	-	-
시 비	소요		1,050	460	-	-	-
	집행		585		-	-	-
구 비	소요	2,540	1,953	800	-	-	-
	집행	2,469	1,811		-	-	-
기 타	소요	300	210		-	-	-
	집행	300	210		-	-	-

8. 위치도 및 현황사진

○ 위치도(2024년 정비대상지 6개소)

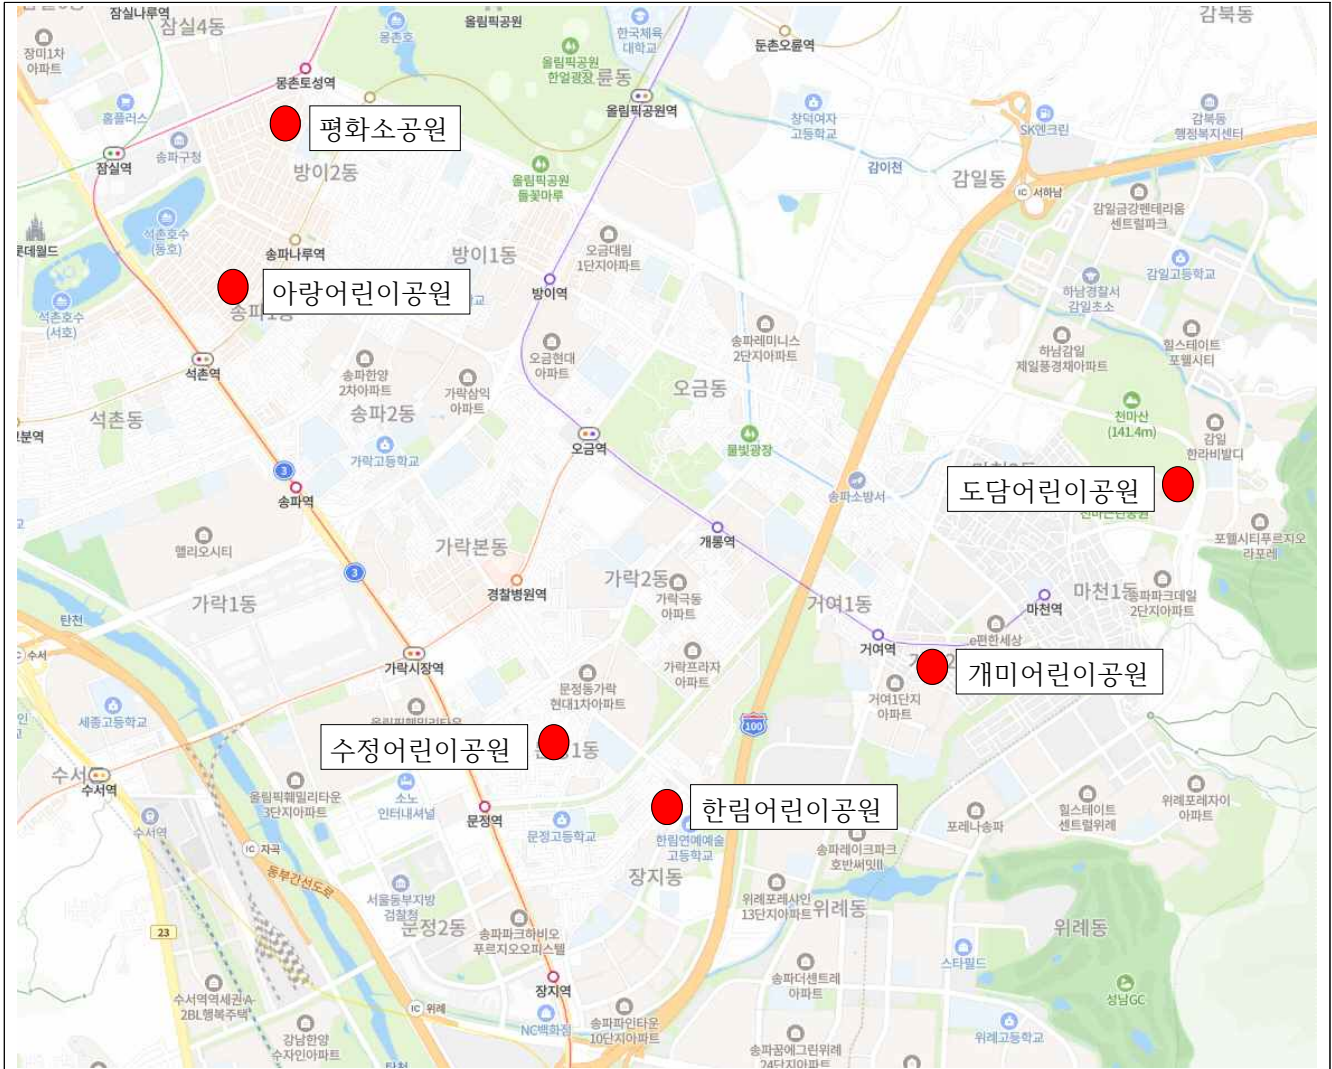

○ 현장사진(2023년 정비공원)



공원녹지과	과장 주동희	공원2팀장 김소연	담당 전해진 (☎ 3387)
-------	--------	-----------	-----------------
